



ID	Aktivitet	Aktivetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	2024	2025					
							Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3
1		Fremdriftsplan IT-Bygget											
2													
3		Milepeler	245 dager	fr 10.05.24	fr 30.05.25								
4		Kontrakt	0 dager	fr 10.05.24	fr 10.05.24								
5		Oppstart byggeplass	0 dager	ma 01.07.24	ma 01.07.24								
6		Tett bygg teknisk rom	0 dager	fr 22.11.24	fr 22.11.24								
7		Ferdig bygget	0 dager	ma 24.03.25	ma 24.03.25								
8		Funksjonstest	0 dager	ma 27.05.24	ma 27.05.24								
9		Overlevering	0 dager	fr 30.05.25	fr 30.05.25								
10													
11		Mobilisering og planlegging	30 dager	ma 10.06.24	fr 09.08.24								
12		Mobilisering	15 dager	ma 10.06.24	fr 28.06.24								
13		Tilrigging på byggeplass	15 dager	ma 01.07.24	fr 09.08.24	12							
14													
15		Gjennomføring	205 dager	ma 12.08.24	fr 13.06.25								
16		Riving forberedende	35 dager	ma 12.08.24	fr 27.09.24								
17		Plan 4	5 dager	ma 12.08.24	fr 16.08.24	13							
18		Plan 4 Miljøsanering	5 dager	ma 19.08.24	fr 23.08.24	17							
19		Plan 3	5 dager	ma 19.08.24	fr 23.08.24	17							
20		Plan 3 Miljøsanering	5 dager	ma 26.08.24	fr 30.08.24	19							
21		Plan 2	5 dager	ma 26.08.24	fr 30.08.24	19							
22		Plan 2 Miljøsanering	5 dager	ma 02.09.24	fr 06.09.24	21							
23		Plan 1	5 dager	ma 02.09.24	fr 06.09.24	21							
24		Plan 1 Miljøsanering	5 dager	ma 09.09.24	fr 13.09.24	23							
25		Plan Sokkel	5 dager	ma 09.09.24	fr 13.09.24	23							
26		Plan Sokkel Miljøsanering	5 dager	ma 16.09.24	fr 20.09.24	25							
27		Plan Kjeller	5 dager	ma 16.09.24	fr 20.09.24	25							
28		Plan Kjeller Miljøsanering	5 dager	ma 23.09.24	fr 27.09.24	27							
29		Riving kompletterende	80 dager	ma 26.08.24	fr 13.12.24								
30		Plan 4 Riving	15 dager	ma 26.08.24	fr 13.09.24	18							
31		Plan 3 Riving	15 dager	ma 16.09.24	fr 04.10.24	30							
32		Plan 2 Riving	15 dager	ma 07.10.24	fr 25.10.24	31							
33		Plan 1 Riving	15 dager	ma 28.10.24	fr 15.11.24	32							
34		Plan Sokkel Riving	10 dager	ma 18.11.24	fr 29.11.24	33							
35		Plan Kjeller riving	10 dager	ma 02.12.24	fr 13.12.24	34							
36		Teknisk rom på tak	135 dager	ma 09.09.24	fr 28.03.25								
37		Tilrigging for arbeider på tak	10 dager	ma 09.09.24	fr 20.09.24								
38		Riving av tak/isolasjon og provteking rindt innfestingspunkter	10 dager	ma 23.09.24	fr 04.10.24	37							
39		Stålkonstruksjoner	15 dager	ma 07.10.24	fr 25.10.24	38							
40		Tett bygg	20 dager	ma 28.10.24	fr 22.11.24	39							

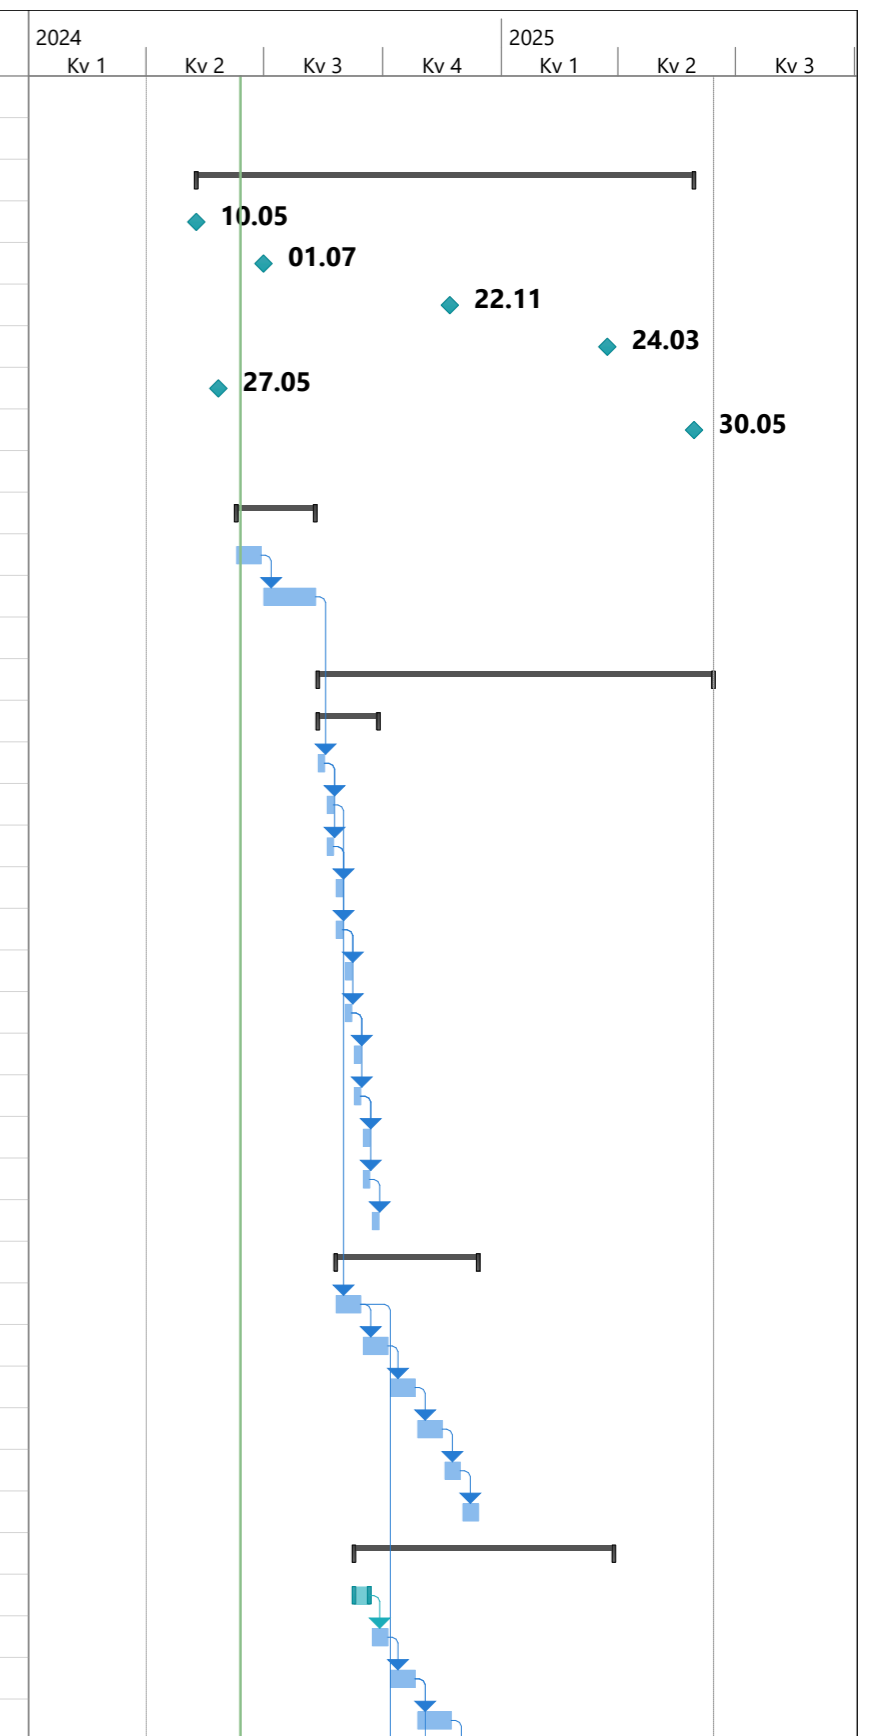


Prosjekt: CS Dato: to 13.06.24	Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
	Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
	Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
	Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
	Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			

ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	2024			2025		
							Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2
41		Takarbeider	20 dager	ma 28.10.24	fr 22.11.24	39						
42		Innredning	20 dager	ma 25.11.24	fr 20.12.24	40						
43		Fasade	20 dager	ma 06.01.25	fr 31.01.25	42						
44		Teknisk leveranse	60 dager	ma 06.01.25	fr 28.03.25	42						
45		Innredning	135 dager	ma 07.10.24	fr 02.05.25							
46		Plan 4	85 dager	ma 07.10.24	fr 14.02.25							
47		Vogn 1 - Forberedende	10 dager	ma 07.10.24	fr 18.10.24	30						
48		Vogn 2 - Bindingsverk og enkling av plate skjørt og vegger	10 dager	ma 21.10.24	fr 01.11.24	47						
49		Vogn 3 - Skulte føringer, og hovedføringer kanaler og kabelbroer	15 dager	ma 04.11.24	fr 22.11.24	48						
50		Vogn 4 - Dobling av platelag og overflater vegg	10 dager	ma 25.11.24	fr 06.12.24	49						
51		Vogn 5 - Himling og teknikk	10 dager	ma 09.12.24	fr 20.12.24	50						
52		Vogn 6 - Gulv	10 dager	ma 06.01.25	fr 17.01.25	51						
53		Vogn 7 - Innredning og komplettering teknikk	10 dager	ma 20.01.25	fr 31.01.25	52						
54		Vogn 8 - Ferdigstillelse og testing	10 dager	ma 03.02.25	fr 14.02.25	53						
55		Plan 3	85 dager	ma 21.10.24	fr 28.02.25							
56		Vogn 1 - Forberedende	10 dager	ma 21.10.24	fr 01.11.24	47						
57		Vogn 2 - Bindingsverk og enkling av plate skjørt og vegger	10 dager	ma 04.11.24	fr 15.11.24	56						
58		Vogn 3 - Skulte føringer, og hovedføringer kanaler og kabekbroer	15 dager	ma 18.11.24	fr 06.12.24	57						
59		Vogn 4 - Dobling av platelag og overflater vegg	10 dager	ma 09.12.24	fr 20.12.24	58						
60		Vogn 5 - Himling og teknikk	10 dager	ma 06.01.25	fr 17.01.25	59						
61		Vogn 6 - Gulv	10 dager	ma 20.01.25	fr 31.01.25	60						
62		Vogn 7 - Innredning og komplettering teknikk	10 dager	ma 03.02.25	fr 14.02.25	61						
63		Vogn 8 - Ferdigstillelse og testing	10 dager	ma 17.02.25	fr 28.02.25	62						
64		Plan 2	85 dager	ma 04.11.24	fr 14.03.25							
65		Vogn 1 - Forberedende	10 dager	ma 04.11.24	fr 15.11.24	56						
66		Vogn 2 - Bindingsverk og enkling av plate skjørt og vegger	10 dager	ma 18.11.24	fr 29.11.24	65						
67		Vogn 3 - Skulte føringer, og hovedføringer kanaler og kabekbroer	15 dager	ma 02.12.24	fr 20.12.24	66						
68		Vogn 4 - Dobling av platelag og overflater vegg	10 dager	ma 06.01.25	fr 17.01.25	67						
69		Vogn 5 - Himling og teknikk	10 dager	ma 20.01.25	fr 31.01.25	68						
70		Vogn 6 - Gulv	10 dager	ma 03.02.25	fr 14.02.25	69						
71		Vogn 7 - Innredning og komplettering teknikk	10 dager	ma 17.02.25	fr 28.02.25	70						
72		Vogn 8 - Ferdigstillelse og testing	10 dager	ma 03.03.25	fr 14.03.25	71						
73		Plan 1	85 dager	ma 18.11.24	fr 28.03.25							
74		Vogn 1 - Forberedende	10 dager	ma 18.11.24	fr 29.11.24	65						
75		Vogn 2 - Bindingsverk og enkling av plate skjørt og vegger	10 dager	ma 02.12.24	fr 13.12.24	74						
76		Vogn 3 - Skulte føringer, og hovedføringer kanaler og kabekbroer	15 dager	ma 16.12.24	fr 17.01.25	75						
77		Vogn 4 - Dobling av platelag og overflater vegg	10 dager	ma 20.01.25	fr 31.01.25	76						
78		Vogn 5 - Himling og teknikk	10 dager	ma 03.02.25	fr 14.02.25	77						
79		Vogn 6 - Gulv	10 dager	ma 17.02.25	fr 28.02.25	78						
80		Vogn 7 - Innredning og komplettering teknikk	10 dager	ma 03.03.25	fr 14.03.25	79						

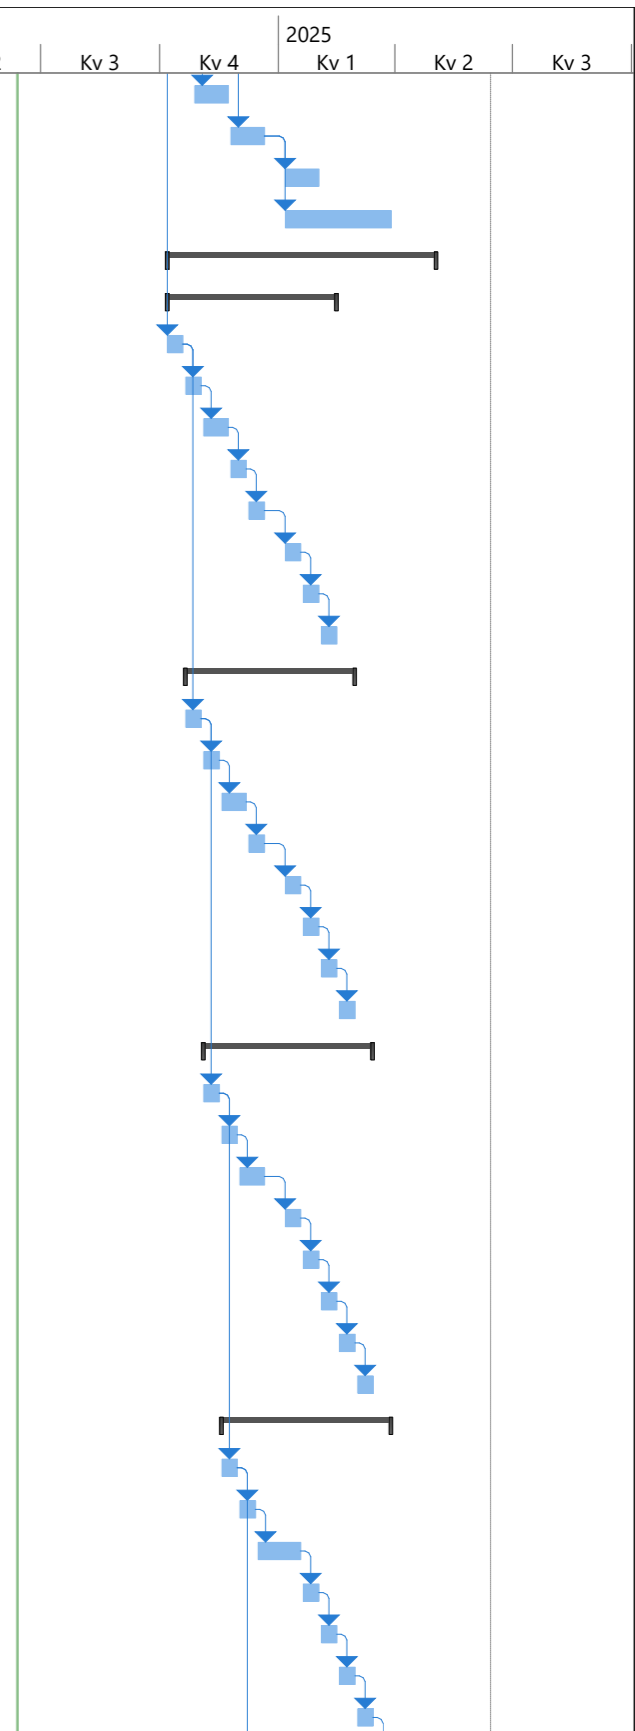

Prosjekt: CS Dato: to 13.06.24	Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
	Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
	Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
	Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
	Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			

ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	2024			2025		
							Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2
81	→	Vogn 8 - Ferdigstillelse og testing	10 dager	ma 17.03.25	fr 28.03.25	80						
82	→	Plan Sokkel	85 dager	ma 02.12.24	fr 11.04.25							
83	→	Vogn 1 - Forberedende	10 dager	ma 02.12.24	fr 13.12.24	74						
84	→	Vogn 2 - Bindingsverk og enkling av plate skjørt og vegger	10 dager	ma 16.12.24	fr 10.01.25	83						
85	→	Vogn 3 - Skulte føringer, og hovedføringer kanaler og kabekbroer	15 dager	ma 13.01.25	fr 31.01.25	84						
86	→	Vogn 4 - Dobling av platelag og overflater vegg	10 dager	ma 03.02.25	fr 14.02.25	85						
87	→	Vogn 5 - Himling og teknikk	10 dager	ma 17.02.25	fr 28.02.25	86						
88	→	Vogn 6 - Gulv	10 dager	ma 03.03.25	fr 14.03.25	87						
89	→	Vogn 7 - Innredning og komplettering teknikk	10 dager	ma 17.03.25	fr 28.03.25	88						
90	→	Vogn 8 - Ferdigstillelse og testing	10 dager	ma 31.03.25	fr 11.04.25	89						
91	→	Plan Kjeller	85 dager	ma 16.12.24	fr 02.05.25							
92	→	Vogn 1 - Forberedende	10 dager	ma 16.12.24	fr 10.01.25	83						
93	→	Vogn 2 - Bindingsverk og enkling av plate skjørt og vegger	10 dager	ma 13.01.25	fr 24.01.25	92						
94	→	Vogn 3 - Skulte føringer, og hovedføringer kanaler og kabekbroer	15 dager	ma 27.01.25	fr 14.02.25	93						
95	→	Vogn 4 - Dobling av platelag og overflater vegg	10 dager	ma 17.02.25	fr 28.02.25	94						
96	→	Vogn 5 - Himling og teknikk	10 dager	ma 03.03.25	fr 14.03.25	95						
97	→	Vogn 6 - Gulv	10 dager	ma 17.03.25	fr 28.03.25	96						
98	→	Vogn 7 - Innredning og komplettering teknikk	10 dager	ma 31.03.25	fr 11.04.25	97						
99	→	Vogn 8 - Ferdigstillelse og testing	10 dager	ma 21.04.25	fr 02.05.25	98						
100	→	Avsluttende arbeider	70 dager	ma 03.03.25	fr 13.06.25							
101	→	Komplettering utomhus	36 dager	ma 03.03.25	ma 28.04.25							
102	→	Ferdigbefaringer, kompletteringer og feilrettinger	45 dager	ma 17.03.25	fr 23.05.25	99AS-30 dage						
103	→	Storscalatest	2 dager	ma 26.05.25	ti 27.05.25	102						
104	→	Overlevering	5 dager	ma 26.05.25	fr 30.05.25	102						
105	→	Nedrigg byggeplass	10 dager	ma 02.06.25	fr 13.06.25	104						

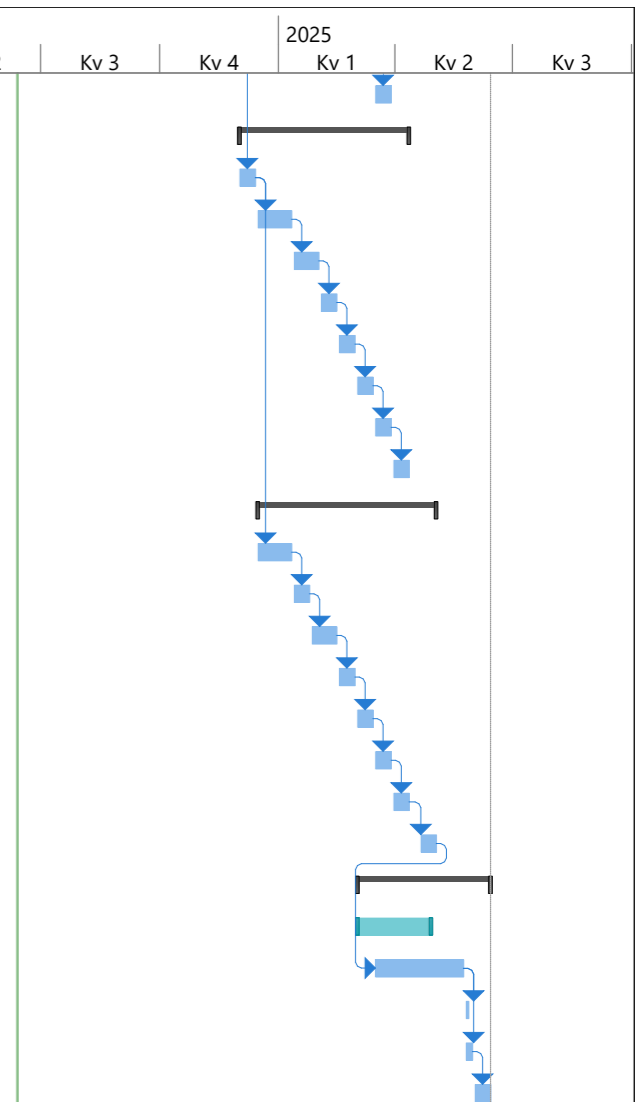

Prosjekt: CS Dato: to 13.06.24	Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
	Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
	Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
	Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
	Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			
