
Møtereferat

Til stede: Frank Arntsen, Trond Singaas, Jens Petter Nygård, Tanja Mathiesen, Torberg Falch, Øyvind Gregersen, Geir E.D Øien, Olav Bolland, Lindis Burheim, Anne Simonsen, Kristoffer Torbjørnsen, Ronny Kjeldsberg, Kirsti Klokkehaug (referent)

Gjelder: Møte i styringsgruppen for Samlokaliseringsprosjektet

Møtetid: 01.11.2017 10-12

Møtested: Hovedbygningen, møterom 230

Styringsgruppen for samlokalisering foreslår at rektor gjør vedtak om:

1. Revidert fremdriftsplan hvor faggruppene innen teknologi flyttes fra Kalvskinnet på ulike tidspunkt for å muliggjøre logistikken som kreves i denne prosessen. Flyttingene vil nå skje i perioden august 2018 til årsskiftet 2019/2020.
2. Deler av ILU lokaliseres fra årsskiftet 2017/2018 i Sverres gt 15 og deler av 1. etg. Akrinn, i tillegg til i nytt lærerbygg CK2.
3. Resten av ILU lokaliseres fra årsskiftet 2018/2019 i 1- 4. etg. i norddel i Gunnerus gt. 1.
4. Skrivesenteret og Matematikksenteret, evt også Skolelaboratoriet lokaliseres på Kalvskinnet fra årsskiftet 2017/2018 innenfor ILUs arealer.
5. Det skal etableres gode og langsiktige løsninger for spesialrom knyttet til virksomheten på Kalvskinnet.
6. Det forutsettes et samarbeid mellom fakultetene om bruk av naturfaglaboratoriene i Akrinn fra 2018.
7. Avd. for studieadministrasjon, Avd. for dokumentasjonsforvaltning, Økonomiavdelingen og IT-avdelingen lokaliseres på Kalvskinnet.
8. Avdeling for studieadministrasjon og deler av IT-avdelingen får midlertidig lokalisering fra tidlig 2018 for at flyttekabalene skal gå opp.
9. Det forutsettes at all undervisning på Kalvskinnet sikres hensiktsmessige undervisningslokaler, og at særtrekkene ved «Forkurset» i denne sammenhengen ivaretas.

For øvrig vil Styringsgruppen vektlegge at følgende forhold ivaretas:

- Vurdere lokalisering av felleslaboratorium NV/IE/IV spesielt
- Vurdere tidspunkt for planlagt flytting av Matteknologi, for å sikre tilstrekkelig tid til ned- og opprigging av laboratorium
- Den revidert framdriftsplanen gjøres tilgjengelig for organisasjonen og det vektlegges spesielt å få tydelig fram «hvem-som-flytter-hvor og når».
- Den anbefalte løsningen forutsetter nærmere vurdering av konsekvenser ved delt lokalisering, slik som transportbehov, timeplanlegging etc. mellom Gløshaugen og Kalvskinnet og evt. Moholt.

Postadresse

7491 Trondheim
Norway

Org.nr. 974 767 880

postmottak@ntnu.no
www.ntnu.no

Besøksadresse

Høgskoleringen 1
Hovedbygningen

Telefon

+47 73595000

Saksbehandler

Trond Singaas



NTNU

Kunnskap for en bedre verden

Samlokalisering etter fusjon

Styringsgruppemøte 1.11.2017

Tema:

- Forslag til rektors vedtak
- Revidert fremdriftsplan
- Oppdatert risikobilde
- Videre prosjektorganisasjon

Hele ILU til Kalvskinnet årsskiftet 2018/2019

Forutsetninger:

- Matematikksenteret og Skolelaboratoriet ut av R-A4 tidlig 2018
- Inst. for elektroniske systemer, elkraftteknikk, teknisk kybernetikk lokalisert i Elektroblokkene D/F, samt i Høgskoleringen 3 innen 1.8.2018
- Fornybar energi lokalisert i Varmeteknisk innen 1.8.2018
- Inst. for Allmennfag lokalisert dels på Kalvskinnet (forkurs), dels på Gløshaugen innen 1.8.2018
- Undervisning IE lokalisert i Realfagbygget A4 innen 1.8.2018
- ILU Moholt lokaliseres på Kalvskinnet årsskiftet 2018/2019

Teknologi til Gløshaugen innen januar 2020

- Inst. for datateknikk og informatikk og Inst. for materialteknologi fortsetter med dagens lokalisering på Kalvskinnets til flyttingene til Valgrinda og Oppredningen er gjennomført, dvs årsskiftet 2019/2020
- Byggearbeider i A blokk Realfagbygget (A3 og A4) starter tidlig 2018
- Renate-senteret lokaliseres på Gløshaugen i IEs arealer, midl. utenfor R-A4 fra tidlig 2018
- Inst for bygg og miljø fortsetter med dagens lokalisering i Arkitekt Christies gt. 2 til årsskiftet 2018/2019
- Mat-teknologi fortsetter med dagens lokalisering i Akrinn til årsskiftet 2018/2019
- Inst for maskinteknikk og produksjon fortsetter med dagens lokalisering i Sverres gt. 10 (evt. i avlastningsarealer) til årsskiftet 2018/2019
- Studentarealer til Innovasjonssenteret Gløshaugen lokaliseres i nye lokaler utenfor Verkstedteknisk tidlig 2018

Behov for midlertidige flyttinger


- A-blokka i Realfagbygget, 2, 3 og 4 etasje må tømmes pga av byggearbeider, samt innflytting av nye miljøer fra høsten 2018.
 - Medfører at IT-avdelingen må flytte ut innen mars 2018
 - Midlertidig lokalisering er under avklaring
- E-blokka i Realfagbygget, 4 etasje må tømmes pga av byggearbeider fra høsten 2018.
 - Avd for Studieadministrasjon og Multimedialab må flytte ut innen 1. august 2018.
 - Midlertidig lokalisering i Hovedbygget på Gløshaugen

Styringsgruppa for samlokalisering foreslår at rektor gjør vedtak om:

1. Revidert fremdriftsplan hvor faggruppene innen teknologi flyttes fra Kalvskinnet på ulike tidspunkt for å muliggjøre logistikken som kreves i denne prosessen. Flyttingene vil nå skje i perioden august 2018 til årsskiftet 2019/2020.
2. ILU lokaliseres fra årsskiftet 2017/2018 i nytt lærerbygg CK2, i Sverres gt 15 og deler av 1. etg. Akrinn.
3. ILU lokaliseres fra årsskiftet 2018/2019 også i 1- 4. etg. i norddel i Gunnerus gt. 1.
4. Skrivesenteret og Matematikksenteret, evt også Skolelaboratoriet lokaliseres på Kalvskinnet fra årsskiftet 2017/2018 innenfor ILUs arealer.
5. Det skal etableres erstatningsarealer for eksisterende undervisningsareal/dansesal på Moholt som del av videre arbeid, evt i sambruk med andre miljøer.
6. Det forutsettes et samarbeid mellom fakultetene om bruk av naturfaglaboratoriene i Akrinn fra 2018
7. Avd. for studieadministrasjon, Avd. for dokumentasjonsforvaltning, Økonomiavdelingen og IT-avdelingen lokaliseres på Kalvskinnet.
8. Avdeling for studieadministrasjon og deler av IT-avdelingen får midlertidig lokalisering fra tidlig 2018 for at flyttekabalene skal gå opp.

Samlokalisering etter fusjon

- sentrale aktiviteter

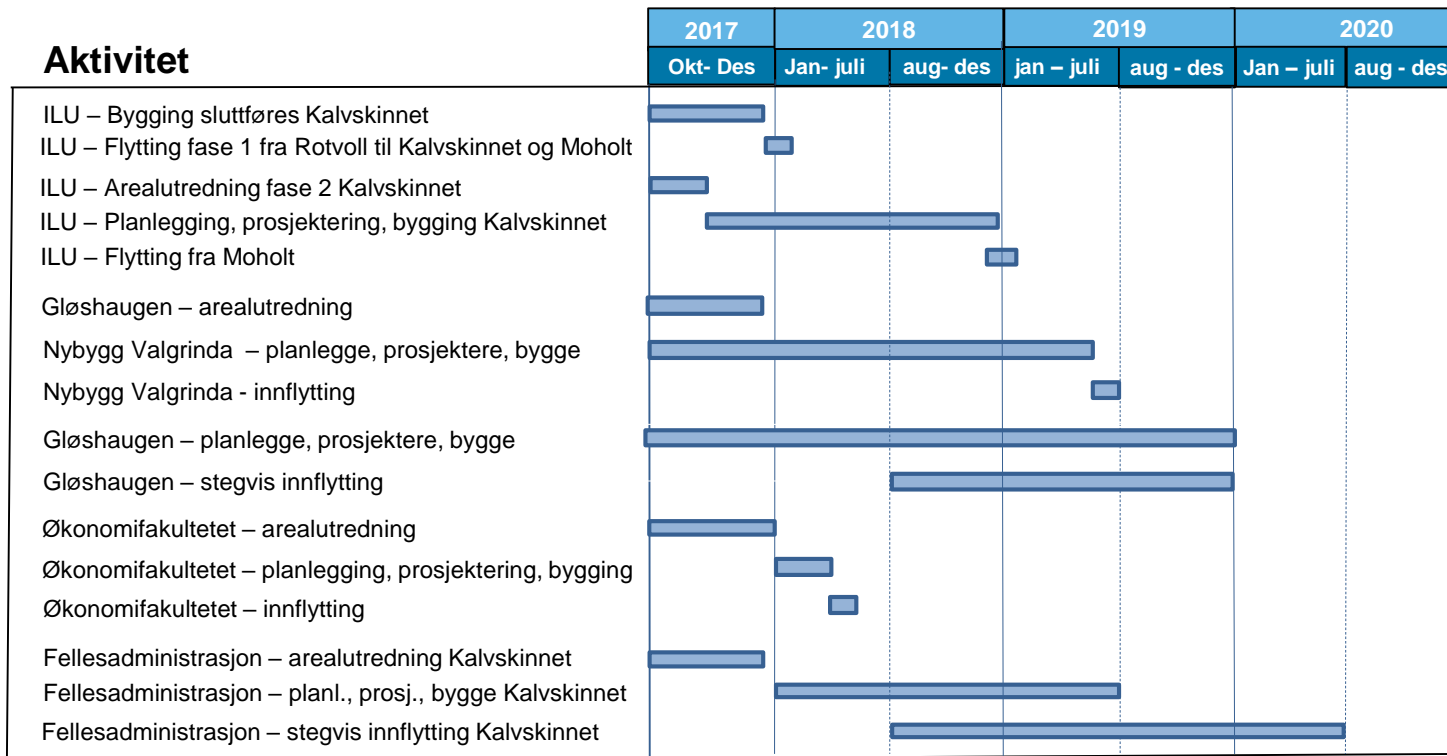


Samlokalisering etter fusjon

- overordnet risikobilde okt 2017 (vs juni 2017)

Sannsynlighet ->

1. Manglende avklaringer/beslutninger
2. Kvalitet ILU
3. Fremdrift ILU
4. Kvalitet Gløshaugen
5. Fremdrift Gløshaugen
6. Økonomi
7. Medvirkning/forankring

Konsekvens ->

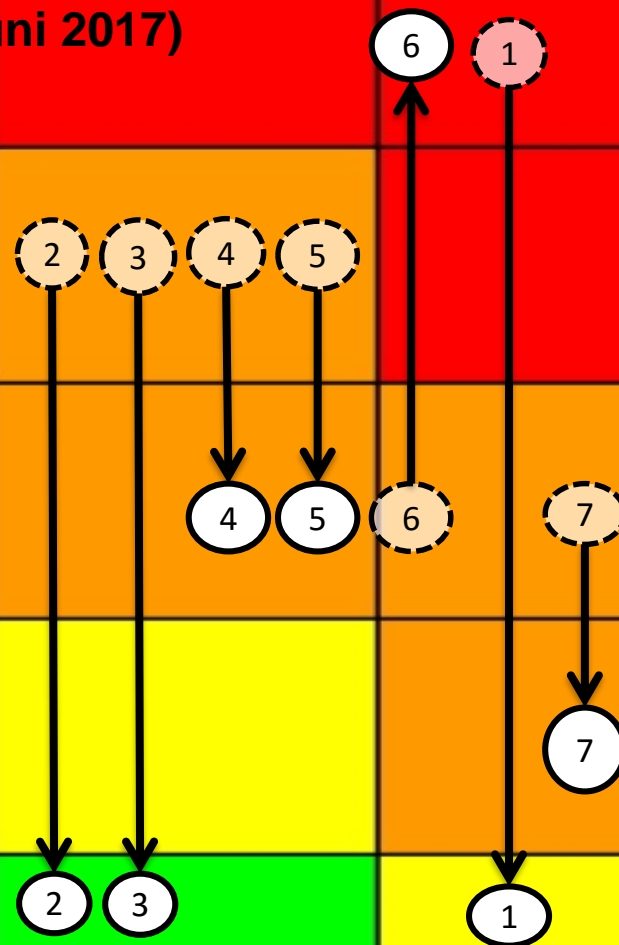

Samlokaliseringsprosjekt fom 1.1.2018 (operativ fra 1.12.2017) prosjektorganisering – foreløpig strukturskisse

